临床项目管理部

工作手册

Clinical Project Management Handbook

文件信息	内容
版本号	临床项目管理部工作手册 V1
文件状态	已审阅 （2026/10/30）
文件 Owner	临床项目管理部
生效日期	2026/11/11
保密级别	内部使用

目录

第一章 部门介绍与岗位职责 3

1.1 手册目的与适用范围 3

1.2 部门定位 3

1.3 部门组织架构 3

1.4 CPM 与 CPMD 的角色及职责 4

第二章 项目立项与启动流程 6

2.1 项目立项及决策流程 6

2.2 项目执行方案评估及决策流程 7

2.3 项目启动总体流程 8

第三章 项目管理核心活动 9

3.1 时间线与里程碑管理 9

3.2 风险、问题、变更与升级管理 10

3.3 项目沟通与会议记录管理 10

3.4 关键项目管理计划及文件 11

第四章 项目管理工具包与新人指引 12

4.1 工具包与新人指引链接 12

4.2 手册维护 12

第一章 部门介绍与岗位职责

1.1 手册目的与适用范围

本手册用于帮助临床项目管理新员工及承接项目的项目管理人员快速了解部门定位、岗位职责、项目评估与启动流程、主要项目管理活动，以及常用工具和资源。

适用人员包括：

- 临床项目经理 (Clinical Project Manager, CPM)
- 临床项目管理总监 (Clinical Project Management Director, CPMD)
- 承担项目管理支持职责的相关人员
- 需要了解临床项目管理接口和工作方式的跨职能合作人员

1.2 部门定位

临床项目管理部负责临床项目的整体规划、跨职能协调、进度和里程碑管理、风险与问题管理、项目决策推动及关键交付管理。部门通过建立清晰的项目目标、计划、治理和沟通机制，促进各职能围绕共同目标协作，推动项目在既定质量、时间、资源和预算目标下开展。

CPM 的核心价值 将来自医学、临床运营、注册、安全、数据、统计、供应、财务及外部合作方的信息整合为可执行的共同计划，并持续推动偏差识别、问题解决、决策形成与行动落实。

1.3 部门组织架构

临床项目管理部按照公司批准的组织架构和岗位体系开展人员及职能管理 （图一）。部门内部通过明确的汇报关系进行资源配置、人员发展、能力建设及日常管理。



图一、 部门组织架构图 （数据截止至 2026 年 10 月）

1.4 CPM 与 CPMD 的角色及职责

临床项目经理（Clinical Project Manager，CPM）与临床项目管理总监（Clinical Project Management Director，CPMD）是公司项目管理团队的核心岗位。CPM 主要负责单个项目的计划、执行和协调管理，CPMD 主要负责项目组合层面的统筹管理和决策支持。

需要说明的是，公司采用 CPM 和 CPMD 作为项目管理岗位设置。在国际多中心研究中，会使用 Global Project Manager（GPM）和 Clinical Trial Manager（CTM）的角色进行项目管理和临床运营分工（图二）。在单一国家研究中公司现阶段由 CPM 统一承担项目管理及临床运营协调职责，在项目层面统筹项目计划、进度管理、跨部门协作及研究执行管理等工作。因此其职责范围覆盖部分 GPM 和 CTM 的职能。CPMD 则从更高管理层面负责项目组合监督、资源配置、重大问题升级及战略决策支持，以确保项目目标与公司整体研发策略保持一致。

本节仅概述 CPM 与 CPMD 在临床项目管理中的核心职责和协作边界。完整的岗位职责、任职要求及汇报关系，请参见公司现行的《CPM 岗位说明书》和《CPMD 岗位说明书》；如本手册与正式岗位说明书存在不一致，以现行有效的岗位说明书为准。

管理维度	CPM 主要职责	CPMD 主要职责
项目规划与执行	组织项目启动，制定并维护项目计划、时间线，协调跨职能团队推进项目交付	审核关键项目计划，从产品线或项目组合层面监督项目进展和优先级
风险与决策	识别并跟踪风险、问题和变更，准备决策信息并按机制升级	指导重大风险和变更处理，推动超出项目团队权限的事项进入相应决策层级
资源与外部合作	跟踪预算和资源需求，负责项目层面的 CRO 及关键供应商监督	协调重大资源和预算事项，指导外包策略及重大供应商问题处理
沟通与汇报	组织项目会议、跟踪行动项，并准备项目状态报告	为 CPM 提供指导，协调管理层沟通并汇报重大项目事项

备注： CPM 负责组织、协调和推动， CPMD 负责对重大事项进行指导和监督，但不替代医学、注册、安全、数据等职能作出其专业领域判断；审批权限以公司治理机制、授权矩阵及现行 SOP 为准。

Project Management
RACI 项目管理矩阵
R=Responsible
A=Accountable
C=Consulted
I = Informed

Project Role	GPM	CTM
Overall Project Timeline	R&A	C&I
Country Level Timeline	A,C&I	R
Overall Project Budget	R&A*	I
Country level Site Budget	I	R&A
Project Level Vendor Selection Coordination	R&A	C&I
Project Level Vendor Management	R&A*	C&I
Cross Functional Project Alignment Coordination	R&A	C&I
Country level Cross-functional Team Alignment	C&I	R&A
Country level Investigator /Site Management	C&I	R&A
Overall Project Quality & Risk Management	R&A	C&I
Country level Quality management	C&I	R&A^
All Project level Operatoinal related Plans	R&A*	C (if country specific requirement)&I

* GPM may delegate to CTM/ Cross functional representative with supervision

^ CTM may be delegated to conduct Quality Control related activities if no ML QC representative available in the country

图二、 临床项目管理 RACI 职责矩阵

第二章 项目立项与启动流程

临床项目通常根据不同开发阶段进行评估、决策和管理。在进入早期开发前，相关职能对项目的科学性、临床价值、实施可行性、资源需求及风险进行综合评估。随着临床数据和开发信息积累，项目在关键节点接受进一步评估，以决定是否进入下一阶段（III 期阶段）。CPM 负责组织和协调评估与启动活动，汇总项目进展、风险、资源需求和待决策事项，推动其按治理机制完成审议，并跟踪决策结果、后续行动和项目计划落实。

2.1 项目立项及决策流程

项目在不同开发阶段应依据既定标准和治理机制进行审议，判断项目是否值得开展、是否符合公司策略。评估结果可包括批准进入下一阶段、有条件批准、暂缓、调整开发策略或终止。对批准进入下一阶段的项目，应同步明确目标、范围、关键假设、资源投入、项目负责人及启动要求。项目评估与立项是项目由研究构想逐步进入正式执行的重要过程（图三）。 项目通常从方案摘要及研究提案的形成开始，经项目时间、预算及价值评估，并结合公司整体策略确认战略匹配度；完成前期评估并通过相应决策后，进入正式项目建立阶段，由 CPM 注册项目号并推动后续工作。随后，项目团队进一步明确合作模式，完善研究方案，并协调相关部门进行确认。在项目推进过程中，通过关键决策节点对项目价值、战略匹配度及方案成熟度进行阶段性评估，支持项目是否进入下一阶段的决策。




图三、 项目立项流程图

其中步骤 A 和 B 中（图四），具体的方案合成和评审门槛是包括：由医学部门（Asset Lead/Medical Lead）发起研究提案，并组织跨部门讨论形成研究提案（Study Proposal）。Study Proposal 经注册、统计及运营三个职能部门负责人审核通过后，方可进入项目时间、预算及价值评估阶段（步骤 B）；具体参与评估人员由各职能部门主管指定。



图四、方案合成和评审门槛


关于步骤 F（图五），Lead PI 决策是由临床研发部门 CPM 组织制定 Lead PI 筛选及沟通计划，并与 CRO、SMO 及销售总监召开会议、收集反馈；各方达成一致后，将推荐结果提交决策会议汇报并确认 Lead PI。

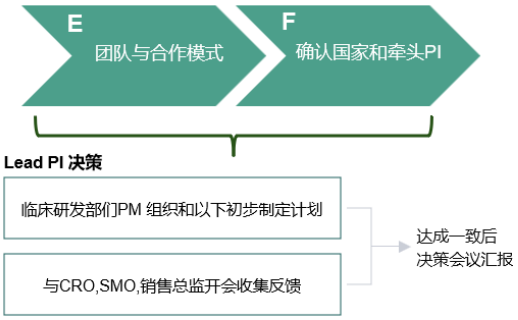

图五、 Lead PI 决策路径

2.2 项目执行方案评估及决策流程

项目通过前期评估并进入执行准备阶段后，CPM 应进一步推动研究执行方案及项目可行性评估，将前期研究构想逐步转化为可执行的项目计划。项目完成前期评估并明确方案摘要后，进一步开展研究执行方案及项目可行性评估。首先，结合方案摘要（Synopsis）及临床开发计划（Clinical Development Plan），通过外部专家咨询等方式，对项目初步时间计划、参研国家及中心数量等关键执行假设进行评估。随后，由项目管理、注册法规、临床医学及财务等相关职能共同参与进一步评估，结合内化及外包模式分别明确预算和项目进度计划，并通过团队会议综合讨论确定项目执行模式，在此基础上形成 PMP 初稿。具体流程见下图（图六）。

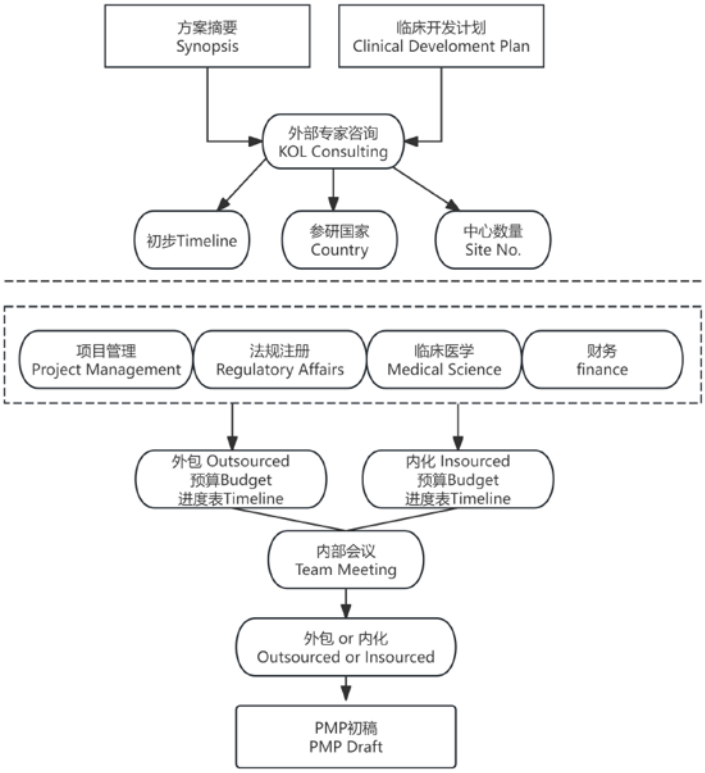

图六、 项目执行方案的评估和决策流程图

2.3 项目启动总体流程

项目执行方案及执行模式基本确定后，项目进入正式启动阶段。CPM 应以获批的项目策略、方案摘要及 PMP 初稿为基础，组织相关职能部门组建项目团队，明确项目目标、团队职责、工作分工及沟通与决策机制，并统筹推进项目启动阶段的各项准备工作。项目团队应结合项目总体目标进一步完善项目管理计划，梳理关键工作事项及其依赖关系，明确责任人和计划安排，并协调内部职能部门及外部合作方按计划开展相关工作。通过项目启动会议及持续跟踪，确保团队对项目目标、执行策略和近期重点任务形成一致理解，为项目进入正式执行阶段奠定基础。具体启动流程见下图七。



图七、项目启动流程图

第三章 项目管理核心活动


项目进入正式执行后，CPM 负责建立并维护整体管理机制，持续协调跨职能团队，跟踪项目计划、关键里程碑、风险、问题及依赖关系，及时识别实际进展与既定目标之间的偏差，并推动制定和落实相应措施。CPM 不仅负责状态整合和跟踪，还应促进团队形成共同认知，明确责任人和完成时限，推动重大问题和待决策事项按治理机制及时升级，并确保重要决策、行动项及项目资料得到适当记录和保存。

3.1 时间线与里程碑管理

项目时间线是统筹项目活动、明确任务衔接及跟踪项目进展的重要管理工具。CPM 应根据项目目标、方案设计及执行策略，组织相关职能部门制定项目总体时间线，明确各项关键活动的计划周期、先后顺序、依赖关系及责任分工，并识别影响项目整体进度的关键路径。

项目里程碑应覆盖方案定稿、供应商确定、监管及伦理递交与批准、中心合同签署、中心启动及首例受试者入组（FPFV）等关键节点。对于涉及多个国家或地区的项目，应结合当地监管要求及实际执行周期分别制定启动计划，并纳入项目总体时间线统一管理。图八所示的研究启动标准时间线为项目规划提供参考基线（baseline），反映项目在正常资源配置和执行条件下的基本目标周期。项目管理层将结合既往项目执行数据及未来业务需求，定期制定和更新关键里程碑节点 KPI，并将关键节点按期达成情况作为项目团队绩效考核的重要衡量指标之一。项目团队应结合项目复杂度、开发阶段、国家或地区要求以及资源情况进行具体分析和动态调整，以确保时间线的科学性和可执行性。

项目执行过程中，CPM 应定期组织团队更新并审阅时间线，比较计划进度与实际进展，及时识别潜在延迟及其对后续活动和关键里程碑的影响。对于可能影响关键路径或总体目标的进度偏差，应协调相关责任方制定应对措施，并按照项目沟通及升级机制进行汇报和处理。

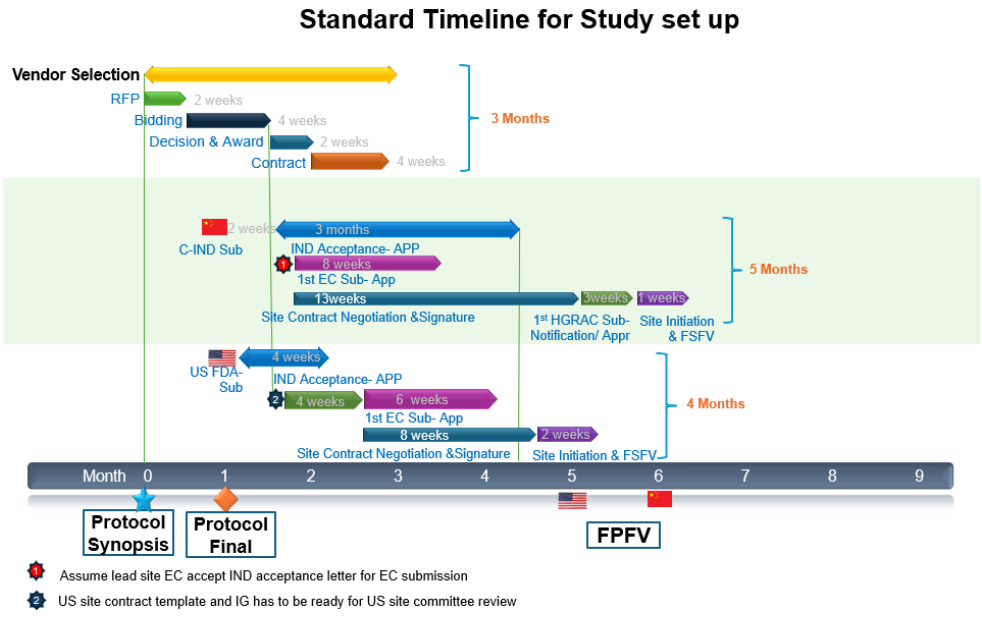

图八、 研究启动标准时间线和里程碑示例

3.2 风险、问题、变更与升级管理

风险、问题、变更与升级管理旨在及时识别和评估可能影响项目目标实现的各类事项，并通过持续跟踪、跨职能协作及必要的决策升级，减少其对项目范围、时间、预算、质量及合规性的影响。

CPM 应组织项目团队建立统一的识别、评估、记录、跟踪和关闭机制，明确责任人及应对措施，并根据事项的影响程度和紧迫性及时进行沟通或升级。对于可能导致项目目标、执行策略、关键里程碑、预算或资源发生调整的事项，应按照适用的变更管理及决策流程进行评估和批准，确保相关决策可追溯，并及时同步至受影响的职能部门及项目文件。

管理类别	简要说明	主要管理要求	参考文件
风险管理	尚未发生，但可能对项目目标或计划产生影响的不确定事项。	识别并评估风险发生的可能性及影响程度，制定预防或缓解措施，明确责任人并进行持续跟踪。	详见对应的SOP，以最新版本为准。
问题管理	已经发生，并对项目执行或项目目标造成实际影响的事项。	评估问题影响，明确解决措施、责任人及完成时限，跟踪处理进展直至关闭。	
变更管理	对已批准的项目范围、策略、计划、预算、资源或关键交付内容进行调整。	分析变更原因及影响，按照授权要求完成评估和批准，并及时更新相关计划、文件及沟通内容。	
升级管理	超出项目团队既定权限或无法在规定时间内解决，需要提交更高层级协调或决策的事项。	根据事项的影响程度、紧迫性和决策权限及时升级，明确所需决策及建议方案，并记录升级结果。	

CPM 负责组织项目团队定期审阅风险、问题及变更事项，推动责任人落实应对措施，并确保重要信息得到及时沟通。对于可能影响关键里程碑、项目预算、研究质量、受试者安全、数据完整性或合规性的重大事项，CPM 应及时协调相关职能部门进行评估，并按照适用的 SOP 及项目升级机制提交相应层级进行决策。

3.3 项目沟通与会议记录管理

有效的项目沟通和会议记录管理有助于确保项目信息及时、准确地传递，促进跨职能团队协作，并保证重要讨论、决策及行动事项清晰、可追溯。CPM 应根据项目需要建立适当的沟通与会议机制，明确会议目的、参会人员、沟通频率及信息传递方式，并推动相关决定和行动事项落实。

CPM 应组织或协调项目例会、跨部门专题会议及其他重要项目沟通。会议应围绕明确的议题开展，需提前准备并分享会议材料。对于会议中形成的决定和行动事项，应明确责任人及计划完成时间，并在后续会议或项目跟踪过程中确认落实情况。

以下会议及沟通材料应进行记录并归档：

类型	记录及归档要求	归档位置

跨部门讨论会议	涉及跨部门讨论的会议应形成会议纪要，记录主要讨论内容、会议结论、决策事项及后续行动项；行动项应明确责任人和计划完成时间。	各项目组指定的 SharePoint 位置
KOL 拜访与沟通	所有 KOL 拜访或正式沟通均应形成会议纪要；会议中使用或分享的演示文稿、方案材料及其他相关文件应与会议纪要一并归档。	
其他重要项目会议	对项目产生重要影响的其他会议，也需形成会议纪要或决策记录，并跟踪相关行动项。	

3.4 关键项目管理计划及文件

关键项目管理计划用于明确项目如何被组织、执行、监督和调整。具体内容请参考临床管理计划 SOP（SOP-CO-2010）。

记录编号	记录名称
SOP-CO-2010-R01	质量管理计划模板
SOP-CD-2003-R06	临床供应商监督计划模板
A-MS-2001	医学监查计划模版
SOP-DM-2002-R01	数据管理计划
SOP-CO-2009-A01	监查计划模版
SOP-PV-2004-R01	安全管理计划模板

备注：上述 SOP 版本更新截止到 2026 年 10 月，后续请以最新版本内容为准。

第四章 项目管理工具包与新人指引

本章提供工作资源入口。工具、模板及新人学习资源等资料会在 SharePoint 独立维护和更新，便于团队成员快速获取并规范使用相关材料。

4.1 工具包与新人指引链接

项目	描述	链接
标准文件	岗位 JD 和 SOP	SharePoint (待定): 临床项目管理工具包与新人指引
新人入职 check list	新员工入职及岗位融入相关事项指引	
项目管理要求文件	项目流程管理材料汇总	
项目会议要求文件	项目汇报及沟通材料汇总	
CPM 培训材料	项目管理相关培训及学习资料汇总	
其他	其他重要材料	

备注：工具包每半年更新一次，请以最新版本内容为准。

4.2 手册维护

- 本手册由临床项目管理部维护。
- 当组织架构、岗位职责、SOP、治理机制或核心流程发生变化时，应及时评估是否需要修订。
- 原则上至少每年复核一次；修订后更新版本号、修订记录和生效日期。
- 模板和工具在其所属资源库独立维护，手册仅保留有效链接，避免嵌入多个静态副本。
- 旧版手册按照公司文件管理要求归档，不与现行版本混用。
